

Документ о концепции и границах проекта (Вигерс, 2014)

Приложение для приема заказов на питание Cafeteria Ordering System

1. Бизнес-требования

1.1. Исходные данные

Большинство сотрудников Process Impact в настоящее время тратят в среднем 65 минут в день, чтобы выбрать, оплатить и съесть обед в кафетерии. Около 20 минут уходит на то, чтобы дойти до кафетерия и вернуться на рабочее место, выбрать еду и оплатить ее наличными или кредитной картой. Таким образом, сотрудники проводят около 90 минут вне рабочих мест. Некоторые звонят в кафетерий заранее, чтобы блюда были готовы к их приходу. Они не всегда получают то, что заказали, потому что некоторые блюда заканчиваются до их прихода. Кафетерий впустую расходует значительный объем продуктов, которые не реализуются, и их приходится выбрасывать. Те же проблемы возникают утром и вечером, хотя гораздо меньше сотрудников завтракает и ужинает, чем обедает.

1.2. Возможности бизнеса

Многие сотрудники попросили создать систему, которая позволила бы посетителям кафетерия делать заказ (определенный как набор из одного или большего числа блюд из меню) по сети, чтобы его можно было забрать или заказать доставку в назначенное место в офисе компании в указанный день в указанное время. Подобная система сэкономит значительное время и позволит получать те блюда, которые хотят клиенты. Это улучшит как качество рабочей среды, так и производительность труда. Кроме того, предоставленные заранее сведения о том, какие блюда хотят получить клиенты, позволит уменьшить потери и увеличит эффективность работы персонала кафетерия. Если сотрудники получают в будущем возможность заказывать доставку блюд из близлежащих ресторанов, то у них появится больший выбор при меньшей цене, так как фирма сможет заключать оптовые соглашения с ресторанами.

1.3. Бизнес-цели

Бизнес-цели-1 (ВО - Business objective). Уменьшить потери продуктов в кафетерии на 40% в течение 6 месяцев после первого выпуска системы".

Масштабы: стоимость продуктов, выбрасываемых каждую неделю персоналом кафетерия.

Способ измерения: исследование системы учета запасов кафетерия.

Показатели в прошлом: 30% (2013 г., первоначальное исследование).

Планируемые показатели: менее 20%.

Обязательные показатели: менее 20%.

Бизнес-цели-2. Снизить эксплуатационные расходы кафетерия на 15% в течение 12 месяцев после первого выпуска системы.

Бизнес-цели-3. Увеличить среднее эффективное рабочее время каждого сотрудника на 15 минут в день в течение 6 месяцев после первого выпуска системы.

1.4. Критерии успеха

Критерии успеха-1. 75% сотрудников, которые пользовались кафетерием как минимум три раза в неделю в третьем квартале 2013 года, должны начать использовать Cafeteria Ordering System как минимум раз в неделю в течение 6 месяцев после первого выпуска системы.

Критерии успеха-2. Достичь увеличения среднего рейтинга по ежеквартальному опросу об удовлетворенности работой кафетерия на 0,5 балла по сравнению с третьим кварталом 2013 года по шкале от 1 до 6 в течение 3 месяцев после первого выпуска системы и на 1,0 балла в течение 12 месяцев после первого выпуска системы.

1.5. Видение решения (Положение о концепции проекта)

Для сотрудников, желающих заказывать еду в кафетерии компании или местных ресторанах через Интернет, **Cafeteria Ordering System** – это **интернет-приложение или приложение для смартфона, которое** принимает индивидуальные или групповые заявки на питание, взимает оплату и инициирует доставку готовых блюд к указанному пункту на территории Process Impact. **В отличие** от имеющихся в настоящее время служб заказа по телефону и вручную, **сотрудникам, использующим Cafeteria Ordering System**, не придется приходить в кафетерий, чтобы получать заказанные блюда, что сэкономит время, кроме того, увеличится ассортимент доступных им блюд.

1.6. Бизнес-риски

Бизнес-риски-1. Профсоюз работников кафетериев может потребовать пересмотра контрактов сотрудников кафетерия, чтобы они отражали новое распределение обязанностей и график работы кафетерия. (Вероятность = 0,6; ущерб = 3.)

Бизнес-риски-2. Слишком мало сотрудников могут сразу принять новую систему, что уменьшит прибыль от инвестиций в разработку системы и изменений в схеме работы кафетерия. (Вероятность = 0,3; ущерб = 9.)

Бизнес-риски-3. Близлежащие рестораны могут не согласиться предоставить скидки, что уменьшит удовлетворенность сотрудников системой и возможно, ее использование. (Вероятность = 0,3; ущерб = 3.)

Бизнес-риски-4. Имеющихся возможностей может оказаться недостаточно, из-за чего сотрудники смогут не всегда получать свои заказы и заказывать доставку на нужное время. (Вероятность = 0,5; ущерб = 6.)

1.7. Предположения и зависимости

Предположение-1. У работников кафетерия будут системы с соответствующими интерфейсами для обработки ожидаемого числа заказываемых блюд.

Предположение-2. Число работников кафетерия и автомобилей будет таким, что все блюда будут доставляться в течение 15 минут в рамках указанного времени.

Зависимость-1. Если в ресторане есть собственная система заказов, Cafeteria Ordering System должна поддерживать двустороннюю связь с ней.

2. Рамки и ограничения

2.1. Основные функции

Основные функции-1. Заказ и оплата блюд из меню кафетерия для получения в кафетерии или с доставкой.

Основные функции-2. Заказ и оплата блюд с доставкой из близлежащих ресторанов.

Основные функции-3. Создание, просмотр, изменение и удаление <одинарной или регулярной> заявок на питание или на ежедневные специальные блюда.

Основные функции-4. Создание, просмотр, изменение и удаление меню кафетерия.

Основные функции-5. Просмотр списка ингредиентов и сведения о питательности блюд в меню кафетерия.

Основные функции-6. Обеспечение доступа к системе через корпоративную интрасеть, смартфон, планшет или через внешнее подключение к Интернету для авторизованных сотрудников.

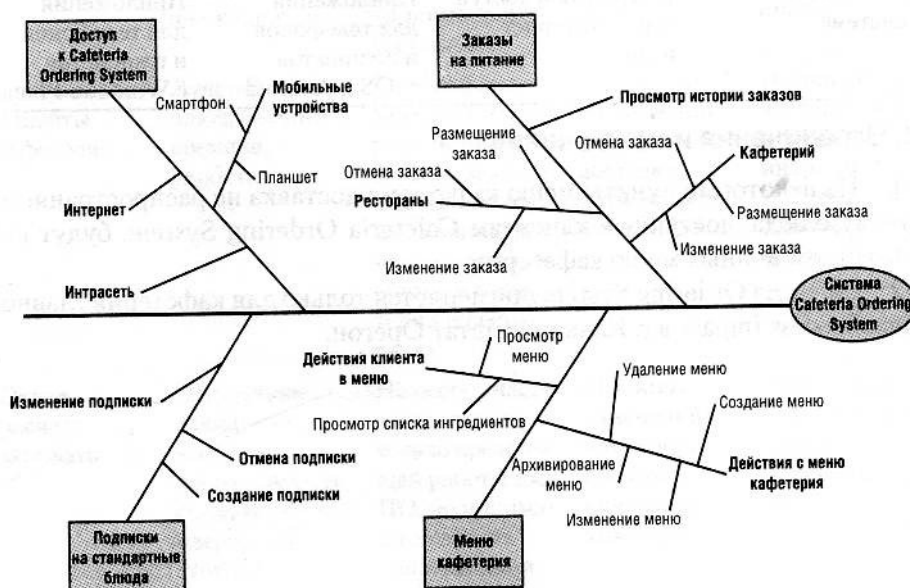


Рисунок 1. Частичное дерево функций системы Cafeteria Ordering System.

2.2. Состав первого и последующих выпусков системы

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
Основные функции-1. Заказ в кафетерии	Только стандартные функции Функции-1 из меню обедов; оплата заказов производится только посредством удержания из зарплаты.	Прием платежа кредитной или дебетовой картой.	Прием заказов на завтраки и ужины.
Основные функции-2. Заказы из ресторанов	Не реализована.	Блюда доставляются только на территории компании.	Реализована полностью.
Основные функции-3. Подписка на стандартные блюда	Не реализована.	Реализация, если позволит время.	Реализована полностью.
Основные функции-4. Меню	Создание и просмотр меню.	Модификация, удаление и архивирование меню.	
Основные функции-5. Список ингредиентов	Не реализована.	Реализована полностью.	
Основные функции-6. Доступ к системе	Интрасеть и доступ через интернет извне.	Приложения для телефонов и планшетов с iOS и Android.	Приложения для телефонов и планшетов с Windows Phone.

2.3. Ограничения и исключения

Ограничения и исключения-1. На некоторые пункты меню кафетерия доставка не распространяется, поэтому меню, доступные клиентам Cafeteria Ordering System, будут подмножеством полных меню кафетерия.

Ограничения и исключения-2. Cafeteria Ordering System применяется только для кафетерия главного офиса Process Impact в Clackamas, штат Орегон.

3. Бизнес-контекст

3.1. Профили заинтересованных лиц

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Руководство компании	Увеличение производительности труда сотрудников; сокращение затрат в кафетерии.	Сильная поддержка вплоть до выпуска 2; поддержка выпуска 3 в зависимости от результатов предыдущих выпусков.	Экономия расходов должна превысить затраты на разработку и использование.	Не определены.
Сотрудники кафетерия	Более эффективное использование рабочего времени сотрудников в течение дня; большее удовлетворение клиентов.	Озабоченность взаимоотношениями с профсоюзом и возможным сокращением персонала; в остальном — все воспринимается нормально.	Сохранение рабочих мест.	Необходимость обучения сотрудников работе с Интернетом; необходимость в персонале и транспорте для доставки.
Постоянные клиенты кафетерия	Лучший выбор блюд; экономия времени; удобство.	Большой энтузиазм, но могут использовать систему меньше, чем ожидается, из-за социальной значимости обедов в кафетерии и ресторане.	Простота использования; надежность доставки; возможность выбора блюд.	Необходимость доступа к корпоративной интрасети, к Интернету или требуется мобильное устройство.
Отдел расчета зарплаты	Отсутствие какой-либо выгоды; необходимость создания схемы удержания стоимости заказов из зарплаты.	Не особо счастливы относительно предстоящей работы над ПО, но понимают ценность для компании и сотрудников.	Минимум изменений в текущих приложениях расчета зарплаты.	Еще не выделено никаких ресурсов на изменение ПО.
Менеджеры ресторанов	Увеличение продаж; выход на новые области рынка для подключения новых клиентов.	Поддерживают, но с осторожностью.	Минимум новых технологий; озабоченность ресурсами и затратами, необходимыми для доставки блюд.	Могут не иметь персонала и возможностей для обработки нужных объемов заказов; не у всех меню представлены в Интернете.

3.2. Приоритеты проекта

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
Функции	Все функции, запланированные к выпуску 1.0, должны быть полностью реализованы.		
Качество	95% пользовательских проверочных испытаний должны быть выполнены; все тесты на защищенность должны быть выполнены.		
Сроки			По плану выпуск 1 должен быть доступен к концу 1 квартала следующего года, выпуск 2 — к концу второго квартала, допустима задержка до 2 недель без пересмотра сроков куратором проекта (заказчиком).
Расходы			До 15% процентов перерасхода по бюджету возможны без пересмотра куратором проекта (заказчиком).
Персонал		Планируемый состав команды: работающий на полставки менеджер проекта, 2 разработчика, тестировщик, работающий на полставки; при необходимости могут быть дополнительно привлечены разработчик и тестировщик, оба работающие на полставки.	

3.3. Особенности развертывания

ПО веб-сервера нужно обновить до последней версии. В рамках второго выпуска нужно разработать приложение для смартфонов и планшетов под управлением iOS и Android, а в третьем выпуске нужно выпустить приложение для смартфонов и планшетов с Windows Phone. К моменту готовности второго выпуска все соответствующие изменения должны быть выполнены. Нужно разработать видеоролики длительностью не более 5 минут, обучающие пользователей работе с интернет-версией и приложениями Cafeteria Ordering System.
